Мандат

ПАКЕТ АНАЛИТИКИ · ДОКУМЕНТ 04

План внедрения и развития



От соревнования к пилоту и тиражированию: сроки, ворота перехода, ресурсы, риски

Версия 1.0
27.10.2026
к этапу «Спринт 1»

Трек ВТБ «Финтех без границ»
«Академия Финтеха 2026», задача «Онбординг и проверка полномочий»

Команда «Мандата»
Коньков Дмитрий
Конькова Елена
github.com/KonkovDV/Mandat

Содержание

1 Главное
2 Горизонты
3 До финала соревнования
4 Теневой пилот
5 Ворота перехода
6 Развитие продукта
7 Ресурсы и бюджет
8 Нормативный календарь
9 Риски
10 Показатели
11 Ближайшие 90 дней

Главное

ГЛАВНОЕ


- **Горизонты.** Соревнование — до финала 11.12.2026; подготовка пилота — декабрь — февраль; теневой пилот — шесть недель в марте — апреле 2027 года; промышленный пилот и первый договор — май — октябрь 2027 года; эксплуатация и тиражирование — с ноября 2027 года.
- **Ворота.** Каждый переход — решение по измеримым критериям; главный стоп-критерий на всех этапах — первое ложное «подтверждено».
- **Ресурсы.** Команда растёт с двух основателей до 4 человек в 2027 году и до 8 к 2031 году в базовом сценарии; до выхода на операционную прибыль в 2029 году нужно 33 млн ₽.
- **Главные риски** — данные банка для пилота, сроки ИБ-оценки и решение банка сделать продукт самому. Меры — синтетический корпус и разметка экспертами банка, ранний анализ уязвимостей, открытое ядро и цена ниже собственной разработки.
- **Ближайшие 90 дней:** интервью и протокол пилота к финалу 11.12.2026, заявка в Акселератор ВТБ, регистрация компании и заявка на грант.

Горизонты

Горизонт	Сроки	Цель	Результат	Ворота на выходе
1. Соревнование	до 11.12.2026	показать работающий продукт и план пилота	срез продукта, пакет аналитики, итоги интервью, протокол пилота, живое демо	G0
2. Подготовка пилота	12.2026 — 02.2027	договориться о пилоте и подготовить контур	заявка в Акселератор ВТБ, NDA, подписанный протокол, данные, утверждённые правила	G1
3. Теневой пилот	6 недель, 03 — 04.2027	измерить качество и эффект на данных ВТБ	журнал расхождений, независимая разметка, акт с решением	G2
4. Промышленный пилот	05 — 10.2027	подключить реальные источники и пройти ИБ	адаптеры, СКЗИ, строгий профиль, анализ уязвимостей, договор	G3
5. Эксплуатация и тиражирование	с 11.2027	первая операция в эксплуатации, новые операции и банки	годовая подписка ВТБ, банки уровня 2, второй банк уровня 1	G4

План с октября 2026 по июнь 2028 года

Полосы — работы, ромбы — ворота и даты норм

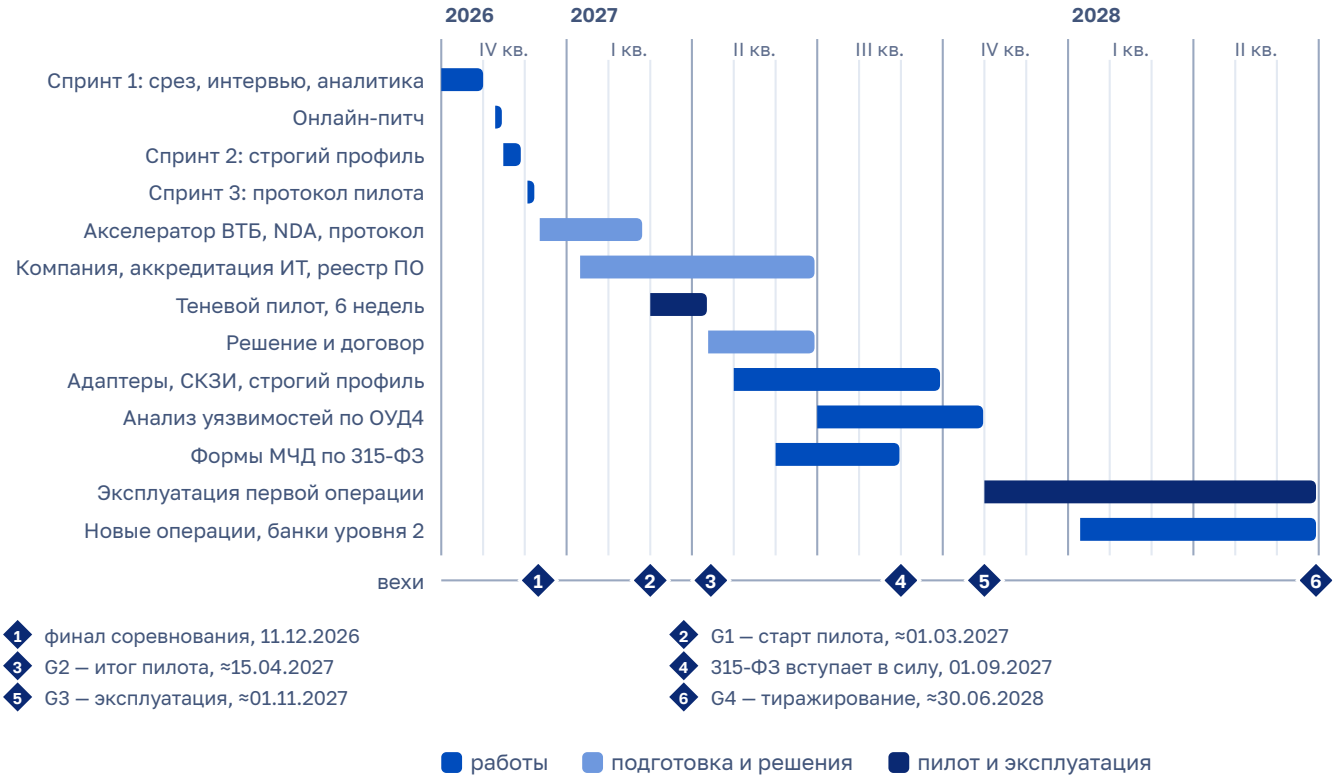

1. финал соревнования, 11.12.2026
2. G1 — старт пилота, ≈01.03.2027
3. G2 — итог пилота, ≈15.04.2027
4. 315-ФЗ вступает в силу, 01.09.2027
5. G3 — эксплуатация, ≈01.11.2027
6. G4 — тиражирование, ≈30.06.2028

План команды; сроки соревнования — fintechacademy.ru, сверено 13.10.2026

До финала соревнования

Сроки этапов — по сайту соревнования. Что сдаём на каждом этапе и что уже готово:

Этап	Срок	Что делаем	Готово сейчас
Спринт 1	до 01.11.2026	вертикальный срез, пакет аналитики, начало интервью	14 демо-кейсов, отчёт, журнал, удостоверение со статусом; этот пакет
Онлайн-питч	10–15.11.2026	5 минут по сценарию показа, ответы на вопросы	презентация, сценарий демо
Спринт 2	16–29.11.2026	строгий профиль на обезличенных кейсах эксперта; запрос XSD `EMCHD_1` у оператора реестра; прототип проверки КЭП через СКЗИ	строгий профиль работает, без СКЗИ «подтверждено» не выдаёт
Спринт 3	03–08.12.2026	протокол пилота; расчёт эффекта на цифрах интервью; контракт интеграции с ДБО (OpenAPI)	план пилота, калькулятор эффекта, OpenAPI
Финал	11.12.2026	живое демо и ответы жюри	демо на стенде

Теневой пилот

Операция: право подписи платёжных документов в интернет-банке для представителя по МЧД. «Мандат» проверяет те же пакеты, что и сотрудники, но на выдачу прав не влияет.

Неделя	Что делаем	Результат
1	протокол, регламент операции, коды полномочий, метрики и пороги приёмки, куратор от владельца процесса	подписанный протокол
2–5	параллельная проверка; каждое расхождение с решением сотрудника — в журнал	журнал, промежуточный отчёт
6	независимая разметка расхождений, замер, решение	акт: продолжать или остановить

Критерии продолжения (фиксируются до старта): ни одного ложного «подтверждено» за весь пилот, а верхняя граница 95 % ниже порога банка; каждое расхождение разобрано; доля кейсов без ручного разбора не ниже порога, ошибки среди них не выше порога; согласие «Мандата» с экспертами не ниже согласия экспертов между собой; проверка пакета быстрее ручной, и сотрудники принимают карточку как достаточное обоснование.

Кто за что отвечает

Р — делает, О — отвечает за результат, К — консультирует, И — информируется.

Работа	Команда «Мандата»	Владелец процесса ВТБ	Юрист ВТБ	ИБ ВТБ	ИТ ВТБ	Акселератор ВТБ
Протокол пилота, метрики и пороги	Р	О	К	К	И	К
Утверждение правил и окна «свежей» смены руководителя	Р	И	О	–	–	–
Данные: обезличенные пакеты или тестовый контур	К	О	И	К	Р	И
Установка в контуре банка	Р	И	–	К	О	И
Параллельная проверка и журнал расхождений	Р	О	И	И	К	И
Независимая разметка расхождений	К	О	Р	–	–	И
Решение по итогам пилота	К	О	К	К	К	И

Ворота перехода

Ворота	Когда	Критерии	Кто решает	Если «нет»
G0. Пилот интересен банку	финал, 11.12.2026	у ВТБ есть владелец процесса; протокол пилота готов	жюри, Акселератор ВТБ	продолжаем интервью и ищем владельца процесса
G1. Старт пилота	≈01.03.2027	подписан протокол; метрики и пороги; 50–100 обезличенных пакетов или разметка корпуса; юрист утвердил правила операции	владелец процесса ВТБ	переносим старт; качество измеряем на разметке корпуса экспертами банка
G2. Итог пилота	неделя 6, ≈15.04.2027	критерии продолжения выполнены; измеренный эффект не ниже консервативного сценария	владелец процесса, риск, юрист	дорабатываем правила и повторяем на новой выборке или останавливаемся; при малом эффекте — снижаем цену или подписка только на мониторинг
G3. Промышленная эксплуатация	≈01.11.2027	анализ уязвимостей пройден; ГОСТ-подпись через СКЗИ; адаптеры к источникам; правила утверждены; регламент и обучение	ИБ и ИТ ВТБ	режим рекомендаций сотруднику без влияния на права
G4. Тиражирование	≈30.06.2028	полгода эксплуатации без ложного «подтверждено»; эффект измерен; второй банк в переговорах	команда и инвесторы	остаёмся с ВТБ и партнёрами, команду не расширяем

Развитие продукта


Период	Продукт	Рынок и компания
IV кв. 2026	строгий профиль на обезличенных кейсах; прототип проверки КЭП через СКЗИ; контракт интеграции с ДБО; видео-демо	8–12 интервью и опрос; финал; заявка в Акселератор ВТБ
I кв. 2027	адаптеры к тестовому контуру ВТБ; коды полномочий из ЕСНСИ; корпус от 300 пакетов с независимой разметкой	регистрация компании, аккредитация ИТ; теневой пилот
II кв. 2027	извлечение ограничений устава моделью с обязательной цитатой; ГОСТ-подпись удостоверений через СКЗИ банка	итог пилота; договор с ВТБ
III кв. 2027	формы МЧД по 315-ФЗ к 01.09.2027; анализ уязвимостей по ОУД4	заявка в реестр российского ПО
IV кв. 2027	эксплуатация первой операции; события мониторинга для антифрода	первые разговоры с банками уровня 2
2028	новые операции: открытие счёта, смена пользователей ДБО, кредиты и гарантии; символьная проверка правил передоверия	второй банк уровня 1 — переговоры и пилот; первые банки уровня 2
2029–2031	роли сотрудников компании как проверяемые удостоверения (по образцу GLEIF vLEI); формы ЕС для зарубежных партнёров	партнёрский канал через поставщиков ДБО; некредитные финансовые организации

Ресурсы и бюджет

Команда

Команда по годам

Ставок на конец года, три сценария

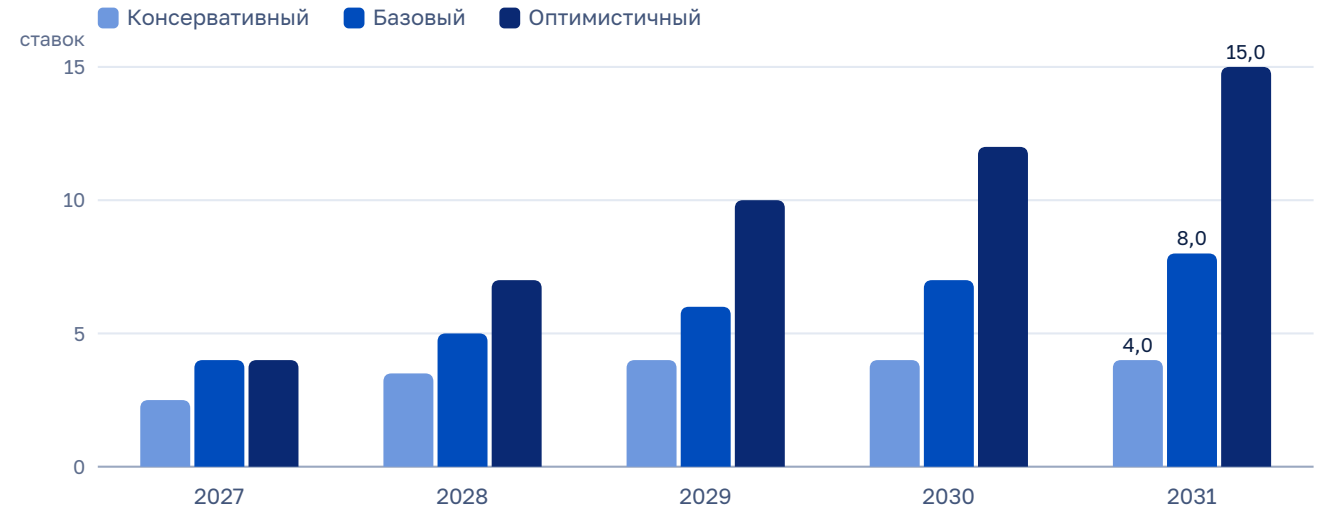

Модель, лист «План»

Ставок на конец года, базовый сценарий	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основатели: продукт и продажи, архитектура правил	2	2	2	2	2	2
Разработчики	0	1	1	1	2	2
Юрист-аналитик правил	0	1	1	1	1	1
Инженеры внедрения и поддержки	0	0	1	1	1	1
Инженер качества и ИБ	0	0	0	1	1	1
Менеджер по работе с банками	0	0	0	0	0	1

Нанимаем под договоры: юрист-аналитик правил — с 2027 года, инженер внедрения — с первым банком, инженер качества и ИБ — к промышленной эксплуатации, менеджер по работе с банками — когда банков уровня 2 становится больше пяти.

Деньги, базовый сценарий

Млн ₽	2027	2028	2029	2030	2031	2027–2031
Выручка	8,0	17,9	34,1	43,4	67,8	171,0
Затраты	22,1	25,0	32,2	39,3	47,7	166,3
Операционная прибыль (EBITDA)	−14,1	−7,1	1,9	4,0	20,1	4,8
Свободный денежный поток	−16,0	−9,5	−2,2	1,7	13,6	−12,6
Накопленный поток	−16,0	−25,6	−27,8	−26,1	−12,6	

Наибольший накопленный дефицит — 27,8 млн ₽; с запасом 20 % нужно **33 млн ₽** (консервативный сценарий — 78 млн ₽, оптимистичный — 39 млн ₽). Деньги нужны в 2027–2028 годах, до регулярной подписки.

Откуда деньги

Источник	Сумма	Когда	Условие
Призовой фонд «Академии Финтеха 2026»	350, 250 или 150 тыс. ₽ за места в треке	11.12.2026	при призовом месте
Фонд содействия инновациям, «Студенческий стартап»	1 млн ₽	2027	если команда подходит под условия конкурса вторичный
Фонд содействия инновациям, «Старт-1»	до 5 млн ₽	2027	после регистрации компании вторичный
Плата ВТБ за внедрение	8 млн ₽ в базовом сценарии	2027	договор после пилота
Посевные инвестиции	остаток потребности	II — III кв. 2027	после итога пилота: измеренный эффект снижает риск инвестора

Призовой фонд — fintechacademy.ru, сверено 13.10.2026. Условия грантов 2026–2027 годов нужно сверить на сайте фонда. Гранты и инвестиции в денежный поток модели не входят.

Нормативный календарь


Дата	Норма	Что меняется	Что готовим
01.09.2024	63-ФЗ в ред. 476-ФЗ	представитель юрлица подписывает своей КЭП вместе с МЧД	основа продукта
01.02.2026	Приказ Минцифры № 1001	новые реквизиты МЧД: паспорт не обязателен, нужны СНИЛС и ИНН	правило R-FMT-003
с 01.09.2026	210-ФЗ, поэтапно до 01.01.2028	второй пакет мер против кибермошенничества (по обзорам закона)	следим, как нормы применяются к юрлицам
10.07.2027	Регламент ЕС 2024/1624	банк собирает сведения о лице, действующем от имени клиента	ориентир для правил; RTS AMLA — проект
01.09.2027	315-ФЗ	единая форма МЧД универсальна; формы Банка России — дополнительные	адаптер форматов: реестр форматов уже готов
31.07.2028	Директива ЕС 2025/25	выписка о компании ЕС и цифровая доверенность ЕС	ориентир для зарубежных партнёров

М-01, М-03, М-04, М-13, М-14, М-16, М-18 реестра утверждений. Текст 210-ФЗ мы не открывали, применимость к юрлицам не проверена.

Риски

Тепловая карта рисков

Номера — строки реестра ниже; уровень — произведение вероятности и влияния по шкале 1–5

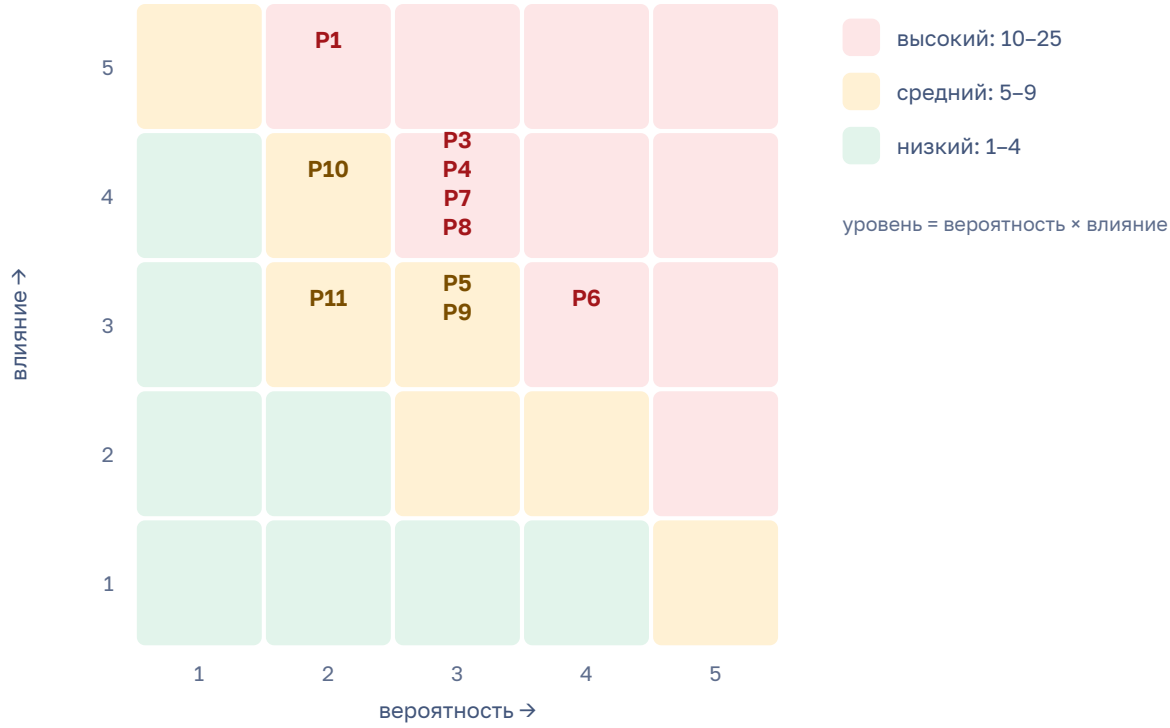

Оценка команды на 27.10.2026

№	Риск	В	Вл	Уровень	Признак	Мера	Владелец
Р1	Ложное «подтверждено» на реальных пакетах	2	5	высокий	любой случай в пилоте	стоп-критерий пилота, строгий профиль, независимая разметка, попытка построить ложное «да»	архитектор правил
Р2	Нет данных банка для пилота	3	4	высокий	к неделе 1 нет пакетов и тестового контура	синтетический корпус и разметка экспертами банка; запрос с первого созвона	капитан
Р3	ИБ-требования удлиняют внедрение	3	4	высокий	нет решения ИБ через 4 недели после пилота	ранний анализ уязвимостей, документы ИБ, работа только в контуре банка	инженер качества и ИБ
Р4	Банк решает сделать сам	3	4	высокий	запрос исходников вместо договора	открытое ядро, цена ниже собственной разработки, сопровождение правил юристом	капитан
Р5	Юрист банка трактует норму иначе	3	3	средний	несогласие по правилу	правила-данные со статусом, утверждение юристом до пилота, журнал изменений	юрист-аналитик
Р6	Меняются нормы и формат МЧД	4	3	высокий	новый приказ, 315-ФЗ	реестр форматов, годовое обновление правил в подписке, мониторинг норм	юрист-аналитик
Р7	Команда из двух человек	3	4	высокий	болезнь, уход, перегрузка	найм разработчика и юриста в 2027 году, документация, воспроизводимая сборка	капитан
Р8	Нет финансирования до первой выручки	3	4	высокий	к марту 2027 нет денег на команду	гранты, акселератор, поэтапный найм, договор с оплатой внедрения	капитан
Р9	Интеграция с ДБО и АБС сложнее плана	3	3	средний	сдвиг сроков адаптеров	порты и OpenAPI готовы, работа с ИТ банка с первой недели	инженер внедрения
Р10	Персональные данные и модель для устава	2	4	средний	требование вывезти данные	работа только в контуре, модель выключена по умолчанию, псевдонимизация	инженер качества и ИБ
Р11	Операторы ЭДО добавят похожую функцию	2	3	средний	анонс функции проверки полномочий	фокус на решении банка, партнёрство и встройка как компонент	капитан

В — вероятность, Вл — влияние, от 1 до 5. Реестр пересматриваем на каждых воротах.

Показатели

Уровень	Показатель	Цель	Когда меряем
Качество решений	ложные «подтверждено»	0; верхняя граница 95 % ниже порога банка	каждая неделя пилота и эксплуатации
	полнота опровержений	нижняя граница 95 % не ниже порога банка	пилот
	доля решений без человека	не ниже порога, согласованного до старта	пилот
Процесс	время проверки пакета	меньше ручного	пилот
	доля возвратов клиенту	ниже, чем до «Мандата»	эксплуатация
	согласие с экспертами	не ниже согласия экспертов между собой	пилот
Бизнес	банков с договором	1 в 2027 году, 11 к 2031 году (базовый сценарий)	ежегодно
	годовая подписка на конец года	75 млн ₽ к 2031 году (базовый сценарий)	ежегодно
	эффект для ВТБ	не ниже консервативного сценария: 33 ставок и 34 млн ₽ ущерба в год	итог пилота и год эксплуатации

Ближайшие 90 дней

Срок	Задача	Результат
до 01.11.2026	сдать Спринт 1: срез продукта и пакет аналитики	ссылка на пакет в заявке
до 09.11.2026	8–12 интервью и опрос: сотрудники банков, представители компаний, бухгалтеры	итоги интервью, уточнённые допущения модели
10–15.11.2026	онлайн-питч	обратная связь жюри
16–29.11.2026	Спринт 2: строгий профиль на обезличенных кейсах эксперта; запрос XSD `EMCHD_1`	отчёт о качестве на обезличенных кейсах
03–08.12.2026	Спринт 3: протокол пилота, эффект на цифрах интервью	протокол и расчёт
11.12.2026	финал	живое демо
до 25.12.2026	заявка в Акселератор ВТБ, NDA	заявка подана
январь 2027	регистрация компании, заявка на аккредитацию ИТ, заявка на грант	документы поданы
